УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СШ № 23
_____ Т. В. Болотова
«15» февраля 2016 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 01-31

Красноярский край «15» февраля 2016 г.
Наименование территориального образования субъекта Российской Федерации

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта общеобразовательная школа
1.2. Адрес объекта 660078, г. Красноярск, ул. Парашютная, дом 8
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 4894,7 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 585,67 кв.м
1.4. Год постройки здания 1968, последнего капитального ремонта не было
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* 2016, *капитального* не назначена
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 23 с углубленным изучением отдельных предметов», МБОУ СШ № 23
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 660078, г. Красноярск, ул. Парашютная, дом 8

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, реализация дополнительных общеразвивающих программ.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Автобусы 5, 10, 19, 37, 78, 80, 92.
При движении гражданина от остановки автобуса Хлебозавод (со стороны ул. Матросова) пройти до пешеходного перехода (в сторону ул. Матросова), перейти дорогу по пешеходному переходу (60 лет Октября), пройти вдоль домов 84, 82, 62 до перекрестка автомобильной дороги. Перейти дорогу. Пройти по пешеходной дорожке вдоль домов № 2 и 2/2 по улице Парашютная, повернуть направо у дома №8А, пройти до ворот школы, войти.

При движении гражданина от остановки автобуса АЛПИ Енисей (со стороны пос. Базаиха) дойти до перекрестка автомобильных дорог, перейти дорогу. Пройти по пешеходной дорожке вдоль домов № 2 и 2/2 по улице Парашютная, повернуть направо у дома №8А, пройти до ворот школы, войти.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 400 м.
3.2.2 время движения (пешком) 8 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемый; регулируемый
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: бордюры, отделяющие дорогу от пешеходной дорожки
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		1-7
2	Вход (входы) в здание	ДУ		7-10
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ		11-13
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		14-15
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		16-18
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		19-20
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		21-22

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: объект доступен условно.
Требования нормативных документов в планировании и строительстве не выполнены и технически невозможны. Организована помощь инвалидам со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на объекте, организованы альтернативные формы обслуживания (на дому, дистанционно).

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСР
8.	Все зоны и участки	текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ июль 2016 – декабрь 2017
в рамках исполнения плана адаптации основных структурных элементов ОУ

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объект доступен частично избирательно (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями умственного развития)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*
4.4.1. согласование на Комиссии не требуется
4.4.2. согласование работ с надзорными органами не требуется
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации не требуется;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) не требуется;
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов не требуется;
4.4.6. другое не требуется.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта не имеется

4.5. Информация размещена на Карте доступности субъекта Российской Федерации http://kartadostupnosti.ru/

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 2 л.
2. Входа (входов) в здание	на 2 л.
3. Путей движения в здании	на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 1 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте МБОУ СШ № 23 на _____ л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ МБОУ СШ № 23 на _____ л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)_____
_____
_____

Руководитель
рабочей группы заместитель директора по УВР, Сизых А. А. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы заместитель директора по УВР, Федорова Т. А. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

инженер по ОТ, Бакова Т. Г. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

заместитель директора по АХЧ, Кулинич Н. Л. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:
представители общественных
организаций инвалидов председатель местной организации
общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов
Свердловского района», Шапошников Ю. В. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности
ОСИ № 01-31
от «15» февраля 2016 г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МБОУ СШ № 23, г. Красноярск, ул. Парашютная, д.8

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1, 2, 3	отсутствует предупреждающая, тактильная разметка при входе на территорию здания	С	нанесение предупреждающей, тактильной разметки при входе на территорию здания	ТР
					отсутствие информации об ОСИ	Все	установка информации об ОСИ рядом с входом на территорию	ТР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		4, 5, 6	нет тактильной направляющей на путях	С	замена покрытия пешеходных путей	ТР
1.3	Лестница (наружная)	есть		7	не дублируется пандусами или другими средствами подъема	К	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	Орг
1.4	Пандус (наружный)	нет			отсутствует пандус наружный	К, О	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	Орг
1.5	Автостоянка и парковка	нет			отсутствует	К,О	технические решения невозможны – организация	Орг

							альтернативной формы обслуживания	
	ОБЩИЕ требования к зоне				нет информационн ой поддержки на всех путях движения МГН	все	установка информации об ОСИ на путях движения МГН	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		1-7	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_____

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности
ОСИ № 01-31
от «15» февраля 2016 г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
МБОУ СШ № 23, г. Красноярск, ул. Парашютная, д.8

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		7	нет дополнительных разделительных поручней	все	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	Орг
					нет контрастной и рельефной маркировки ступеней	С, О	нанесение контрастной маркировки крайних ступеней и рельефной полосы за 0,8 м до лестницы	ТР
2.2	Пандус (наружный)	нет			отсутствует пандус	К	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	Орг
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		8	отсутствует контрастная полоса перед дверью	С	нанесение контрастной полосы перед дверью за 0,8 м до проема	ТР
2.4	Дверь (входная)	есть		9	отсутствует яркая контрастная маркировка	С	установка контрастной маркировки	ТР

2.5	Тамбур	есть		10				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входы в здание	ДУ		7-10	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_____

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности
ОСИ № 01-31
от «15» февраля 2016 г.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
МБОУ СШ № 23, г. Красноярск, ул. Парашютная, д.8

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		11	отсутствие тактильной информации на путях движения, звуковых информаторов	С, Г	размещение комплексной системы информации на путях движения внутри здания к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям	ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		12	на лестнице нет дополнительных разделительных поручней	К, О	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	Орг
3.3	Пандус (внутри здания)	нет				К	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	Орг
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет				К, О	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	Орг
3.5	Дверь	есть			отсутствует яркая контрастная маркировка	С	установка контрастной маркировки	ТР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		13				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации	ДУ		11-13	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_____

Приложение 4
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 01-31
от «15» февраля 2016 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов
МБОУ СШ № 23, г. Красноярск, ул. Парашютная, д.8

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		14				
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		15	высота порогов не соответствует норме	К, О	замена порогов (двери)	ТР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания	ДУ		14-15	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_____ _____

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 01-31
от «15» февраля 2016 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
МБОУ СШ № 23, г. Красноярск, ул. Парашютная, д.8

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		16	отсутствие поручней, поворотных и откидных сидений нет дублирования информирующих обозначений помещений рельефными знаками	К, О С	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания установка рельефных знаков, информирующих обозначения помещений	Орг ТР
5.2	Душевая/ ванная комната			17	размеры душевой кабины не соответствуют требованиям	К	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	Орг
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть		18	отсутствуют скамьи размером 0,6 на 0,8 м.	К, О	установка скамеек требуемого размера	Орг
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		16-18	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_____

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 01-31
от «15» февраля 2016 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МБОУ СШ № 23, г. Красноярск, ул. Парашютная, д.8

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		19, 20				
6.2	Акустические средства	нет						
6.3	Тактильные средства	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информатизации на объекте	ДУ		19-20	индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_____

Результаты фотофиксации на объекте

1. Вход на территорию (1)

2. Вход на территорию (2)

3. Вход на территорию (3)

4. Путь движения по территории (1)

5. Путь движения по территории (2)

6. Путь движения по территории (3)

7. Лестница

8. Входная площадка

9. Дверь (входная) 	10. Тамбур
11. Коридор (холл) 	12. Лестница (внутри здания) 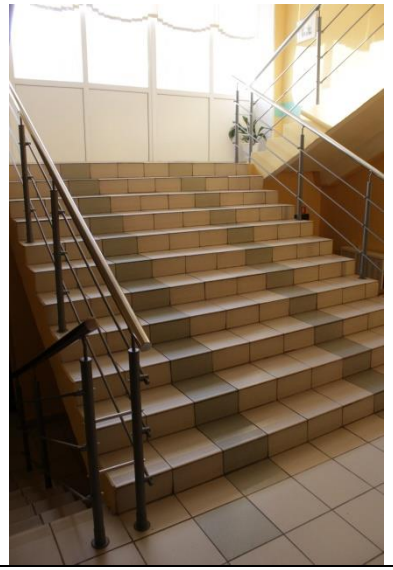

13. Пути эвакуации 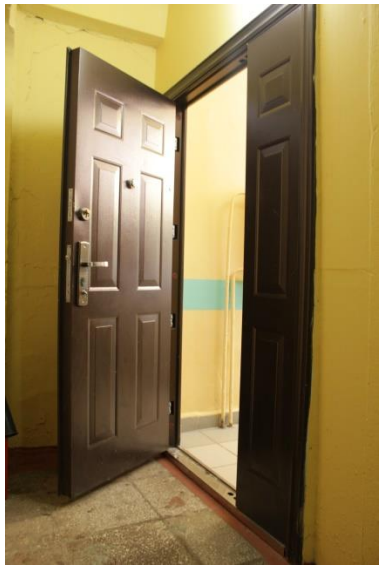	14. Кабинетная форма обслуживания 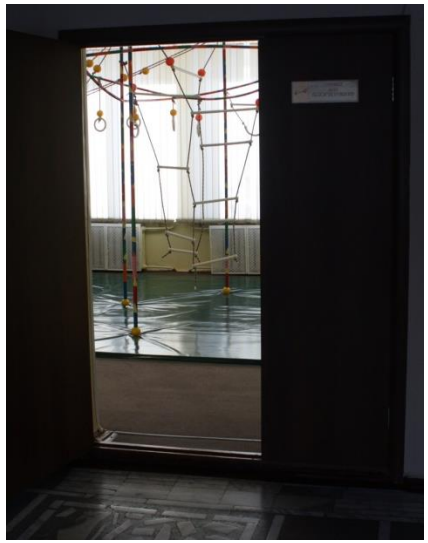
15. Зальная форма обслуживания (столовая) 	16. Туалетная комната

17. Душевая комната 	18. Гардеробная 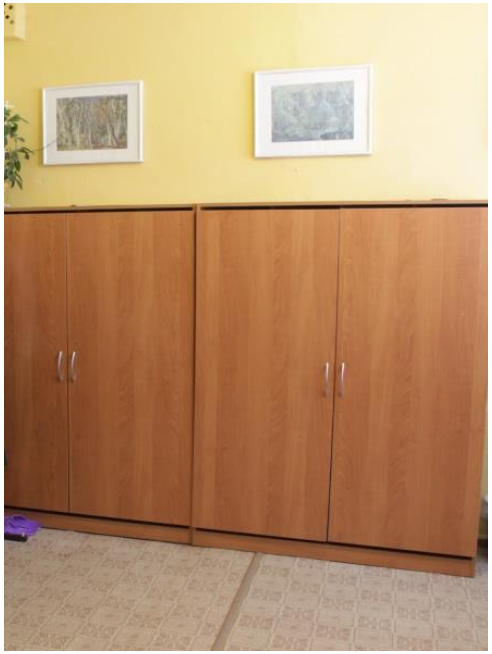
19. Визуальные средства 	20. Визуальные средства

21. Пути движения к объекту (от остановки транспорта АЛПИ Енисей до МБОУ СШ № 23)

А) остановка АЛПИ Енисей

Б) путь к перекрестку автомобильных дорог

В) путь вдоль домов № 2, № 2/2 по улице Парашютная

22. Пути движения к объекту (от остановки транспорта Хлебозавод до МБОУК СШ № 23)

23. А) остановка Хлебозавод

Б) движение к пешеходному переходу

В) пешеходный переход

Г) поворот у дома № 8А по ул. Парашютная

Д) подход к МБОУ СШ № 23

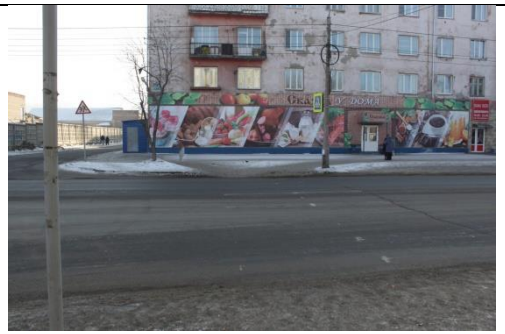

Г) путь вдоль домов 84,82 по ул. 60 лет Октября

Д) путь вдоль дома 62 по ул. 60 лет Октября
